



Lieferwerk: **FBB Hinwil**


Prüfstelle: **Consultest AG**

Gussasphalt - Deklaration 2023 MA 8 H

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code: G623
Bindemittel:			
Ziel-Bitumen	PmB 25/55-65 CH-E NV		
- Dosierung in M-%	7.5		
- löslicher Anteil in M-%	7.4	Toleranz EW = ± 0.5	
Zusätze:			
- Art:	---		
- Dosierung in M-%	---		
- löslicher Anteil in M-%	---		
Rückgewinnung aus Mischgut			
- Penetration: min. [1/10 mm]	n.b.	keine Anforderung	
max. [1/10 mm]	n.b.	keine Anforderung	
- Erweichungspunkt R+K: max.	n.b.	keine Anforderung	
- Bindemittelabfluss	n.b.	keine Anforderung	
Mineralstoffe Herkunft:			
- Füller	Hauri		
- feine Gesteinskörnung	Flüelen		
- grobe Gesteinskörnung	Weiach		
- Min.anteil Sand ≤ 2.0 mm o. Filler	58 M-%		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	42 M-%		
Mineralkategorie	C 95/1	C 95/1	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen			
- Sekundärsplitt M-%	10		
Recycling-Granulat			
- Rein Granulat Deckschicht M-%	---		
- Frässmat. Schutz+Bindersch.M-%	---		
- Raumdichte kg/m3	---		
- Rohdichte kg/m3	---		
Eindringtiefe Statisch		Anforderung ASTRA	erfüllt
- 30min 40° 500 mm2	1.2	± 0.3 mm	ja
- Erhöhung nach 60 min.	0.2	≤ 0.4	
- 300min 22° 100 mm2	---		
Eindringtiefe Dynamisch			
- 2500 Prüfzyklen	1.4	≤ 1.8	
- 2500 - 5000 Prüfzyklen	0.3	≤ 0.5	

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	0102-18-33	ja
gültig bis:	Dezember 2023	
Konformitätserklärung		ja

Korngrössenverteilung:	mm	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100	
(Norm SN EN 12697-1 / EN 933-1)	31.5 [M-%] 100	
	22.4 [M-%] 100	
	16.0 [M-%] 100	
	11.2 [M-%] 100	
	8.0 [M-%] 96	-8/+5
	5.6 [M-%] 83	
	4.0 [M-%] 73	± 8
	2.0 [M-%] 58	± 8
	1.0 [M-%] 50	
	0.5 [M-%] 45	
	0.25 [M-%] 38	
	0.125 [M-%] 33	
	0.063 [M-%] 27	± 4

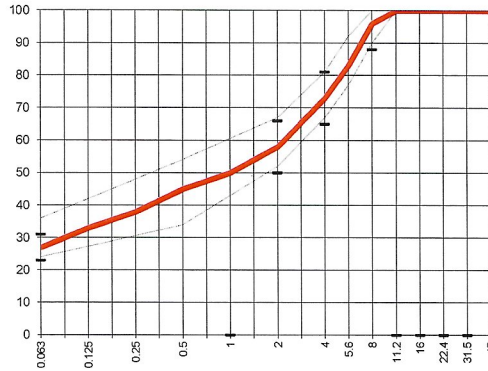

Datum: **18.01.2023**
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk
FBB
 Frischbeton- + Baustoff AG
 HINWIL
 Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: **18.01.2023**
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor
CONSULTEST AG
 Deisrütistrasse 11
 CH-8472 Oringen

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer
